

RAPORT MIESIĘCZNY

Wrzesień 2011

*Zarządzanie kontraktem: budowa Autostrady A1 Toruń – Stryków,
od km 215+850 do km 291+000, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad
realizacją robót.*

Odcinek Sójki – Kotliska

w km 245 +800 do 261+000

RAPORT SPORZĄDZIŁ

RAPORT ZATWIERDZIŁ



SPIS TREŚCI

1.0	OPIS PROJEKTU	4
1.1	Informacje o uczestnikach projektu.....	4
1.2	Informacje o finansowaniu	5
1.3	Główne terminy realizacji projektu.....	5
1.4	Podstawowa informacja o zakresie Robót objętym projektem.....	6
2.0	STAN REALIZACJI KONTRAKTU.....	12
2.1	Warunki atmosferyczne.....	12
2.2	Postęp robót	12
2.3	Informacja o pracach zaplanowanych i niezrealizowanych w okresie objętym raportem.....	17
2.4	Plan Wykonawcy na kolejny miesiąc	17
3.0	ZAANGAŻOWANIE PERSONELU I SPRZĘTU WYKONAWCY	21
3.2	Sprzęt Wykonawcy	21
3.3	Podwykonawcy	22
4.0	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA	22
5.0	BHP	22
6.0	JAKOŚĆ	22
6.1	Programy Zapewnienia Jakości	23
7.0	MATERIAŁY I WYTWÓRNIE	23
7.1	Wytwórnice	23
7.2	Materiały przeznaczone do wbudowania zgłoszone przez Wykonawcę.....	23
7.3	Badania kontrolne wykonywane przez LD w Łodzi	23
8.0	ZMIANY	23
9.0	ROSZCZENIA	24
10.0	ZAANGAŻOWANIE FINANSOWE.....	25
11.0	KONTRAKT NA ZARZĄDZANIE I NADZÓR	25
11.1	Postęp finansowy	25
11.2	Zaangażowanie osobowe zespołu Konsultanta	25
12.0	NADZÓR INŻYNIERA	25
12.1	Nadzór archeologiczny	25
12.2	Nadzór w zakresie wycinki zieleni i drzew.....	25
12.3	Nadzór w zakresie Nadzoru Środowiskowego	25
13.0	KORESPONDENCJA	26

ZAŁĄCZNIKI

1. Termin przekazania budowy
2. Data rozpoczęcia inwestycji
3. Dokumentacja fotograficzna
4. Zestawienie Programów Zapewnienia Jakości
5. Wykaz zgłoszonych materiałów do wbudowania
6. Wykaz badań kontrolnych
7. Zestawienie roszczeń
8. Zaangażowanie finansowe
9. Graficzne przedstawienie postępu robót.
10. Zestawienie osobowe Konsultanta

11. Raport z nadzoru archeologicznego
12. Raport z postępu wycinki i składowania drewna
13. Raport z Nadzoru Środowiskowego
14. Zestawienie Podwykonawców
15. Spotkania z Biurem Projektów
16. Gwarancja i ubezpieczenie Kontraktu
17. Protokoły odbioru oznakowania tymczasowego
18. Wykaz wszystkich decyzji i postanowień administracyjnych- brak decyzji i postanowień
19. Szkice przedstawiające postęp robót na obiektach mostowych
20. Wyniki kontroli pracowników i sprzętu Wykonawcy przeprowadzonej przez Inżyniera w miesiącu Wrześniu 2011 roku.
21. Koorenspondencja
22. Film dokumentujący postęp robót

1.0 OPIS PROJEKTU

1.1 Informacje o uczestnikach Projektu

Zamawiający	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Roosevelta9 90-056Łódź	Kierownicy Projektu: Piotr Bober Tadeusz Krześkiewicz	
Inżynier	<u>Lider:</u> ZBM IZ ul. Julianowska 13 03-338 Warszawa	Inżynier Kontraktu: Andrzej Klenowski	
Wykonawca: Odcinek Sójki- Kotliska	<u>Lider:</u> POLDIM Spółka Akcyjna, ul. Kochanowskiego 37A, 33-100 Tarnów	PrzedstawicielWykonawcy: Witold Miśtak	
Projektanci:	<u>Lider:</u> ArcadisProfil Sp. z o.o. ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa	Przedstawiciel: Andrzej Wiszowaty	
	<u>Lider:</u> BPBK Trakt Sp. z o.o. sp. k. ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice	Przedstawiciel: Grzegorz Nowaczyk	

1.2 Informacje o finansowaniu

- Inżynier Kontraktu

Nazwa Projektu	<i>Zarządzanie kontraktem: budowa Autostrady A1 Toruń – Stryków, od km 215+850 do km 291+000, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.</i>
Wartość Kontraktu na zarządzanie i nadzór	24241479,41 zł (brutto)

- Wykonawca odcinka Sójki – Kotliska

Nazwa Projektu	<i>Budowa Autostrady A1 Toruń-Stryków, na odcinku województwa Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego. Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000, węzeł Sójki -węzeł Kotliska</i>
Wartość Kontraktu na roboty budowlane	542 185 331,87 zł (brutto)

1.3 Główne terminy realizacji projektu

- Inżynier Kontraktu


Wydarzenie	Data
Podpisanie umowy nr 3/08/U/2010 z Konsultantem	20.08.2010r.
Termin zakończenia robót (czas trwania kontraktu 39 miesięcy – do 24 miesięcy realizacja robót objętych Kontraktem, 12 miesięcy okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, 3 miesiące rozliczenie całkowite)	listopad 2013r.

- Wykonawca odcinka Sójki – Kotliska

Wydarzenie	Data
Podpisanie umowy nr 3/06/R/2010 z Wykonawcą	18.06.2010r.
Termin zakończenia robót	30.04.2012r.

Termin przekazania terenu budowy Załącznik nr 1	08.07.2010r.
Data rozpoczęcia inwestycji Załącznik nr 2	16.07.2010r.

1.4 Podstawowa informacja o zakresie Robót objętym projektem

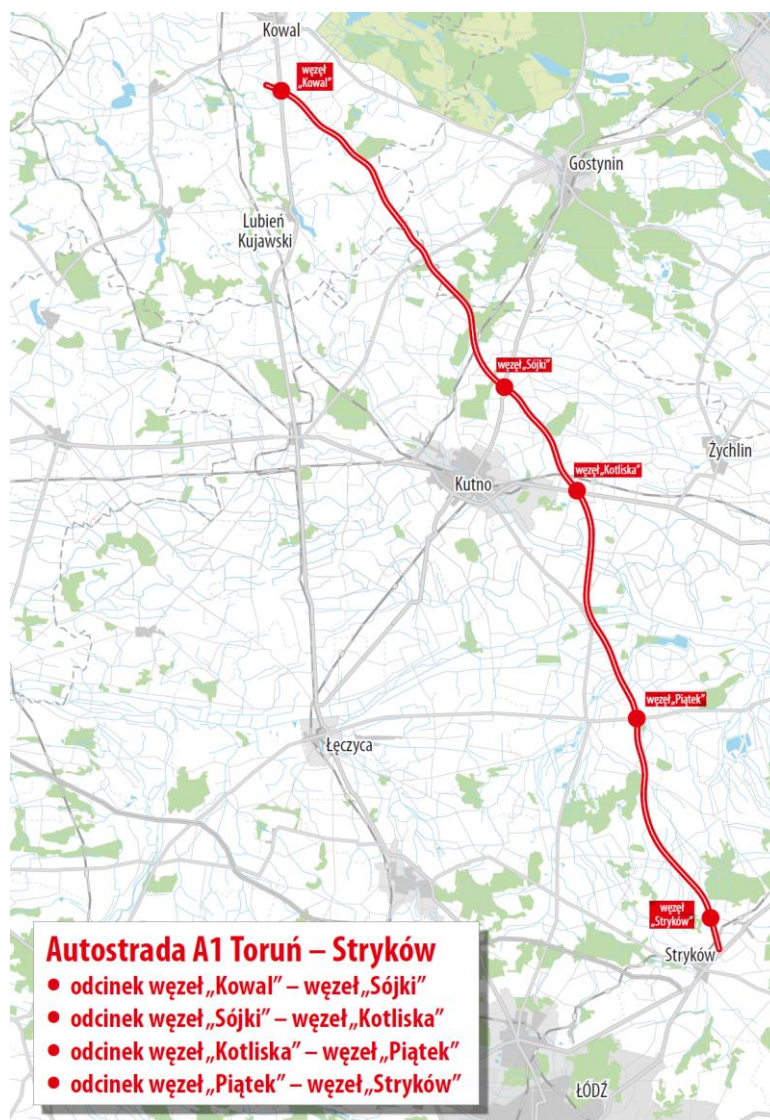

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z realizacją umów o udzielenie zamówień na roboty - zwanych również „Kontraktami”, których przedmiotem jest wykonanie:

- Budowa Autostrady A1 Toruń - Stryków węzeł Kowal - węzeł Sójki od km 215+850 do km 245 + 800 zadanie I odcinek IV/zadanie II odcinek 1A,1B,
- Budowa Autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295 + 850 - zadanie II odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000 , węzeł Sójki - węzeł Kotliska;

- Budowa Autostrady A1, ode. Toruń-Stryków, na odcinku Kotliska (bez węzła)-Piątek (bez węzła); odcinek 2/sekcja 2/ od km 261+000 do km 270+000,
- Budowa Autostrady A1, ode. Toruń-Stryków, na odcinku węzeł Piątek (z węzłem)-węzeł Stryków (bez węzła); odcinek 2/sekcja 3/ od km 270+000 do 273+400 do km oraz odcinek 3 od km 273+400 do km 291+000

W zakresie zadania są również :

- zamienne przejście dla zwierząt dolne w km 228+580 którego projekt zostanie wykonany do dnia 31 lipca 2010r.
- reprofilacja (zmiana rzędnych dna rowów) przy nowoprojektowanych przepustach dla herpetofauny, której projekt zostanie wykonany do dnia 30 września 2010 r.
- dodatkowe, górne przejście dla dużych zwierząt o szerokości 80m w km 226+250 (+/-500m)

ODCINEK C (SÓJKI - KOTLIKA):

Rozwiązania konstrukcyjne odcinka Sójki - Kotliska

A-1 na odcinku od km 245+800 do km 261+000 od węzła „Sójki” bez węzła do węzła „Kotliska” wraz z węzłem „Kotliska”. Zadanie II sekcja 1 odcinek 2.

Zakres przedmiotowej inwestycji:

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:

- wycinka zieleni kolidującej z budową autostrady,
- rozbiórki elementów dróg i ulic,
- rozbiórki elementów sieci uzbrojenia terenu,
- rozbiórki elementów małej architektury i ogrodzeń,
- budynków mieszkalnych i gospodarczych kolidujących z inwestycją.

1. Roboty drogowe:

- budowa autostrady w nowym śladzie zgodnie z parametrami klasy A na całej długości wskazanego przebiegu tj. 15,3 km,
- budowa węzła „Kotliska” wraz ze stacją poboru opłat (SPO),
- budowa miejsc obsługi podróżnych (MOP) wraz z niezbędną infrastrukturą: „Krzyżanów Zach” (MOP II), „Krzyżanów Wsch.” (MOP III)
- *przebudowy dróg:*
 - przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr 2139E Raciborów-Muchnow na długości ok. 0,64 km (WD-203),
 - przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr 2123E Kutno-Żychlin na długości ok.0,52 km (WD-206),
 - przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr 2124E Oporów- DK 2 na długości ok.0,97 km (WA-208),
 - - przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr 2157E Kaszewy Kościelne- Szewce Owsiane na długości ok.0,76 km (WD-213),
 - - przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr 2161E Łąkoszyn - Szewce Owsiane na długości ok.0,58 km (WD-215),
 - przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr 2160E Bielany-Łęki Kościelne na długości ok.0,49 km (WD-218),

- przebudowa dróg gminnych i lokalnych o łącznej długości ok. 2,72 km (WD-204 km 0,46; WD-205 km 0,6; WD-207 km 0,44; WD-212 km 0,67; WD-214 km 0,61)
 - budowa nowych odcinków dróg gminnych i dojazdowych,
 - budowa i przebudowa chodników, zjazdów, zatok, parkingów itp.,
 - budowa dróg wewnętrznych w pasie drogowym autostrady,
 - budowa systemu odwodnienia powierzchniowego.
2. Obiekty inżynierskie:
- budowa 3 obiektów na węźle „Kotliska” (WD-210) w tym 2 wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr 2 (WD-211A, WD-211),
 - budowa 1 obiektu mostowego w ciągu autostrady wraz z przejściem ekologicznym (MA-217),
 - budowa 5 wiaduktów drogowych w ciągu dróg powiatowych (WD-203, WD-206, , WD-213, WD-215, WD-128),
 - budowa wiaduktu autostradowego WA-208 nad drogą powiatową 2124E,
 - budowa 5 wiaduktów w ciągu przebudowywanych dróg gminnych i lokalnych (WD-204, WD-205, WD-207, WD-212, WD-214),
 - budowa przepustów autostradowo-drogowych,
 - budowa 17 przejść i przepustów ekologicznych (P-1, P-17)
 - budowa kładki pieszej łączącej MOP „Krzyżanów Wsch.” i „Krzyżanów Zach. (obiekt KP-214A),
 - budowa wiaduktu autostradowego WA-209 nad linią kolejową Poznań-Warszawa.
3. Kanalizacja deszczowa wraz z przepompowniami i urządzeniami oczyszczającymi:
- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
 - budowa osadników i separatorów,
 - budowa przepompowni.
4. Kanalizacja sanitarna:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z SPO wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z MOP.
5. Sieć wodociągowa i zaopatrzenie wodne w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
- budowa sieci wodociągowej na SPO wraz z zabudową hydrantów ppoż. i zbiornika p.pož.,
 - budowa sieci wodociągowej na MOP wraz z zabudowa hydrantów ppoż. i zbiorników p.pož.
6. Urządzenia ochrony środowiska:
- urządzenia oczyszczające (osadniki, separatory) przed wprowadzeniem ścieków deszczowych oraz roztopowych do odbiorników,

- budowa ekranów akustycznych,
 - system rowów szczelnych na wybranych odcinkach,
 - budowę przepustów ekologicznych i przejść dla zwierząt wymienionych w obiektach inżynierskich.
7. Zieleń:
- nasadzenia.
8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
- bariery ochronne,
 - platformy z kolumnami alarmowymi,
 - elementy oznakowania poziomego i pionowego w tym fundamentowanych konstrukcji bramowych i kratownicowych,
 - ogrodzenie drogi,
 - zjazdy awaryjne,
 - przejazdy awaryjne.
9. Oświetlenie:
- budowa oświetlenia na węzłach,
 - budowa oświetlenia MOP i SPO.
10. Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:
- ciek naturalne oraz urządzenia wodne,
 - linie energetyczne WN, SN i NN,
 - kanalizacja deszczowa,
 - linie teletechniczne,
 - sieć wodociągowa,
 - rurociągi naftowe wraz z budową stacji zasuw SZ325.
11. Zasilanie obiektów autostradowych:
- urządzeń węzłów (oświetlenia, zaplecza SPO, oczyszczalni ścieków sanitarnych, urządzeń stacji pogody, kamer telewizji przemysłowej oraz elektronicznych tablic tekstowych o zmiennej treści),
 - przepompowni ścieków deszczowych,
 - urządzeń MOP „Krzyżanów Wsch.", „Krzyżanów Zach.” (oświetlenia autostrady oraz terenów MOP, przewidywanych stacji paliw wraz ze stacjami obsługi pojazdów, przewidywanych restauracji/hoteli, oczyszczalni ścieków sanitarnych),
 - projektowanej stacji zasuw nr SZ325 rurociągów naftowych.
12. Elementy infrastruktury stacji poboru opłat (SPO) na węźle „Kotliska”:
- budynki zaplecza SPO wraz z instalacjami,
 - zadaszenie stacji poboru opłat,
 - kioski poboru opłat wraz z instalacjami,

- komory przepustowe dla sieci SPO,
- wyspy wydzielające miejsca poboru opłat.

Parametry techniczne dróg.**AUTOSTRADA A-1**

klasa techniczna -	A
prędkość projektowa -	V _p = 120 km/h
prędkość miarodajna -	V _m = 130 km/h
liczba pasów ruchu -	2/2
liczba pasów ruchu docelowa -	2/3
szerokość pasa ruchu -	3,75 m
szerokość pasa awaryjnego -	3,00 m
szerokość podwójnego pasa włączania -	7,00 m
szerokość podwójnego pasa wyłączenia -	7,00 m
szerokość pobocza -	1,25 m
skrajnia pionowa -	4,70 m
klasa obciążenia obiektów w ciągu autostrady -	A+ Stanag 150
dopuszczalne obciążenie nawierzchni -	115 kN/oś
pas dzielący szerokości -	11,00 m - 11,50 m
opaski wewnętrzne szerokości -	0,50 m
pochylenie poprzeczne jezdni -	2,5 %;
szerokość pasa awaryjnego -	3,00 m
skrajnia pionowa -	4,70 m

Parametry węzła Kotliska:

Typ węzła: WA podwójna „trąbka”

Parametry łącznic:

Łącznica „A1” kierunek DK-2-Gdańsk (przedłużenie łącznicy BC):

typ łącznicy -	P1,
prędkość projektowa -	40 km/h,
długość -	134 m.

Łącznica „A2” kierunek A-1 - Warszawa (przedłużenie łącznicy BC):

typ łącznicy -	P1,
prędkość projektowa -	40 km/h,
długość -	129 m.

Łącznica „B1” A-1 Gdańsk - DK-2:

typ łącznicy -	P1,
prędkość projektowa -	40 km/h,
długość -	240 m.

Łącznica „B2” kierunek Warszawa - A-1

typ łącznicy -	P1,
prędkość projektowa -	40 km/h,
długość -	194 m.

Łącznica „C1” A-1 Gdańsk - DK-2

typ łącznicy -	P1,
prędkość projektowa -	40 km/h,
długość -	125 m.
 <i>Łącznica „C2” kierunek Warszawa - A-1</i>	
typ łącznicy -	P1,
prędkość projektowa -	40 km/h,
długość -	155 m.
 <i>Łącznica „D1” A-1 Gdańsk-DK-2</i>	
typ łącznicy -	P1,
prędkość projektowa -	40 km/h,
długość -	103 m.
 <i>Łącznica „D2” kierunek Warszawa - A-1</i>	
typ łącznicy -	P1,
prędkość projektowa -	40 km/h,
długość -	94 m.
 <i>Łącznica „BC” połączenie węzła przy drodze krajowej z węzłem przy autostradzie A-1 wraz z placem poboru opłat</i>	
typ łącznicy -	P4,
prędkość projektowa -	40 km/h,
długość -	1193 m.
 Ogólna długość łącznic na węźle 2367 m.	

2.0 STAN REALIZACJI KONTRAKTU

2.1 Warunki atmosferyczne

W miesiącu sprawozdawczym temperatura wahała się w granicach od 6 °C do 25 °C. Średnia temperatura miesięczna wyniosła 14 °C. Warunki atmosferyczne w miesiącu sprawozdawczym nie odbiegały od średniej wieloletniej i nie utrudniały robót budowlano-montażowych.

2.2 Postęp robót

Graficzne przedstawienie postępu robót – załącznik nr 9

Roboty drogowe:

- Odhumusowanie: łącznice A2 oraz BC,
drogi poprzeczne przy obiektach WD203, WD207, WD210, WD212,
droga dojazdowa DD258LB, DD250LA
drogi manewrowe na MOP-ach
- Wzmocnienie podłoża pod nasypem przy pomocy geowłókniny i 0,5m warstwy kruszywa naturalnego w km: 246+300-246+380, 249+310-249+330, 249+345-249+360, 250+185-250+195, 250+720-250+740, 251+980-252+000, 252+360-252+375, 253+500-253+525, 256+505-256+565, 259+050-259+155,
- Powierzchniowa wymiana gruntu: droga poprzeczna przy WD212 oraz WD214
- Wykonywanie wykopu w km: 260+200-261+000
- Wykonywanie nasypu na trasie głównej w km: 246+000-246+020, 246+300-246+550, 247+650-247+815, 248+570-248+650, 249+300-249+360, 251+000-251+240, 251+980-252+010, 252+330-252+380, 252+750-252+850, 253+500-253+650, 256+500-256+600, 259+360-259+650, 259+900-260+020
- Wykonanie nasypu: - DK nr 92
- łącznice A1, A2, B2, BC, D2 (najazdy na WD210 i WD211A),

- drogi poprzeczne przy obiektach WD204, WD205, WD207,
WD212, WD213, WD214, WD215,
- drogi dojazdowe i manewrowe DD248PB, DD253PL, DD256LA,
DM258 PA

- Zbrojenie geosiatką skarp wysokich nasypów

- Wykonanie górnej warstwy nasypu gr. 30 cm w km:

246+300-246+500,	247+650-247+815,	248+570-248+650,
249+300-249+400,	249+800-249+850,	250+150-250+230,
250+580-250+770,	251+250-251+290,	251+420-251+580,
251+600-251+740,	251+950-252+180,	252+030-252+150,
253+100-253+480,	255+800-256+100	

- Wykonanie górnej warstwy nasypu na drogach dojazdowych: DD253PL oraz DD258LB,

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km:

246+500-246+550,	249+400-249+990,	250+040-250+206,
251+250-251+290,	257+100-257+300,	

- Wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem $R_m=5\text{MPa}$ o gr. 20 cm km:

245+800-246+040 P i L,	246+300-246+550 P,	246+400-246+550 L,
247+700-247+820 P i L,	248+550-248+660 P i L,	249+540-249+820 P,
249+970-249+990 P,	250+050-250+240 P i L,	250+580-250+800 P i L,
251+830-252+040 L,	251+940-252+100 P,	252+020-252+150 L,
252+100-252+150 P,	253+030-253+410 P,	253+140-253+440 L,
254+520-254+800 P,	255+750-256+230 P i L	

- Wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem: DD258LB

- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 22 cm km:

245+800-246+030 P i L, 246+150-246+300 P i L, 246+450-246+500 P,
 247+820-248+050 P, 248+550-248+650 P i L, 249+400-249+980 P i L,
 250+100-251+060 L, 250+200-250+240 P, 250+560-250+830 P,
 251+020-251+150 P, 251+250-252+140 P i L, 253+140-253+430 P i L,
 254+530-255+190 P, 254+800-255+220 L, 255+300-256+240 P i L
 257+100-257+300 P, 257+350-257+525 P

- Warstwa podbudowy z BA WMS 0/16 gr. 17 cm km:

245+800-246+030 P i L, 247+830-248+020 P i L, 249+000-249+270 P i L,
 249+580-249+980 P i L, 250+530-250+840 P i L, 251+330-251+920 P,
 251+330-251+490 L, 251+830-251+920 L, 254+250-254+395 P i L,
 254+580-255+220 P i L, 255+380-256+210 L, 255+535-256+210 P,
 256+850-257+660 P i L, 258+100-258+330 P i L, 258+400-258+710 P,

- Warstwa wiążąca z BA WMS 0/16 gr. 8 cm km:

248+740-249+260 P i L, 250+280-251+210 P, 251+340-251+920 P i L,
 258+050-258+320 L, 258+140-258+320 P, 258+420-258+710 P i L,

- Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową
- Ułożenie ścieku przykrawędziowego z elementów betonowych trójkątnych wzdłuż trasy głównej na długości: 3,0 km
- Wykonywanie rowów autostradowych
- Zasyпка pasa środkowego i poboczy
- Wykonanie zasyпки płyty przy ścianie oporowej: łącznice A2 i D2
- Odnowa i utrzymanie dróg istniejących
- Remont dróg serwisowych

SPO i MOP

- roboty ziemne, roboty żelbetowe – fundamenty, ściany, kanalizacja

Roboty mostowe:

- WD 203 – montaż rusztowań i deskowań, montaż zbrojenia, wykonywanie konstrukcji stalowej
- WD 204 – montaż krawężników, montaż zbrojenia kap chodnikowych, zasyпка przyczółków
- WD 205 – sprężanie ustroju, izolacja ustroju nośnego, zasyпка przyczółków
- WD 206 – zbrojenie ustroju, betonowanie ustroju nośnego
- WD 207 – izolacja ustroju, zasyпка przyczółków
- WA 208 – sprężanie ustroju nośnego (jezdnia lewa), izolacja ustroju, montaż krawężnika i zbrojenia kap chodnikowych (jezdnia prawa)
- WA 209 – zbrojenie i betonowanie fundamentów oraz podpór, próbne obciążenie pali wielkośrednicowych
- WD 210 – malowanie konstrukcji stalowej
- WD 211 – zbrojenie ustroju (jezdnia prawa)
- WD 211A – betonowanie ustroju nośnego, sprężanie płyty
- WD 212 – montaż rusztowania i deskowania ustroju
- WD 213 – montaż rusztowania i deskowania ustroju
- WD 214 – zbrojenie ustroju, betonowanie płyty nośnej, sprężanie płyty
- KP 214A – betonowanie płyty, montaż konstrukcji stalowej
- WD 215 – izolacja płyty, montaż krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych
- MA 217 – zbrojenie i betonowanie fundamentów i podpór, montaż rusztowania
- WD 218 – montaż rusztowania i deskowania ustroju, montaż zbrojenia
- Ściany oporowe: montaż paneli ściany przy WD213, WD218, zasyпка ścian, wykonywanie nasypów zbrojonych
- Przepusty: P16 – zbrojenie i betonowanie przepustu, zasyпка przepustu, układanie izolacji płyt
P32 do P40 – montaż przepustów rurowych

Prezentacja postępu robót na obiektach mostowych przedstawiona została na szkicach stanowiących zał. 1a, 1b i 1c do niniejszego raportu.

Roboty branżowe:

Elektroenergetyka – kontynuacja robót przy kolizjach NN i SN

Teletechnika – kontynuacja robót przy kolizjach TWodociągi – kontynuacja robót przy kolizjach WKanalizacja deszczowa:

- Kolektor KD8 – 55 m
- Kolektor KD10 – 24 m
- Kolektor KD18 – 650 m
- Kolektor KD11A (rura DN300) – 37 m
- Studzienki wpustowe fi 450 – 50 szt.
- Przykanaliki – 400 m

Drenaż i zbiorniki:

- Kolektor KDR30 – 250 m
- Kolektor KDRP11 – 710 m
- Kolektor KDRL5 – 130 m
- Kolektor KDR28A – 150 m
- Kolektor KDRP5 – 350 m
- Kolektor KDR18 – 463,70 m
- Kolektor KDR19 – 146,50 m
- Kolektor KDRL4 – 840 m
- Kolektor KDR16 – 50 m
- Kolektor KDRL2 – 130 m
- Kolektor KDRP2 – 655 m
- Zbiornik ZB2 - 0,60 kpl
- Zbiornik ZB5 - 1,00 kpl
- Zbiornik ZB8 - 0,05 kpl
- Zbiornik ZB13 - 0,30 kpl
- Zbiornik ZB14 - 0,50 kpl
- Zbiornik ZB15 - 1,00 kpl

2.3 Informacja o pracach zaplanowanych i niezrealizowanych w okresie objętym raportem.

W zakresie robót inżynieryjnych nie zostały wykonane:

- WD204 - betonowanie kap chodnikowych
- WD205 - izolacja płyty ustroju, zbrojenie kap chodnikowych
- WD207 - izolacja płyty ustroju, zbrojenie kap chodnikowych
- WD212 - deskowanie ustroju nośnego
- WD213 - rusztowanie i deskowanie ustroju nośnego
- KP214A - rusztowanie i deskowanie schodów
- WD218 - deskowanie i zbrojenie płyty ustroju
- Przepusty - zabezpieczenie antykorozyjne betonu, montaż przepustów rurowych
- Nasypy zbrojone - montaż siatek stalowych

2.4 Plan Wykonawcy na kolejny miesiąc

ROBOTY DROGOWE

- Powierzchniowa wymiana gruntów: **7 450 m³**
- Wzmocnienie podłoża pod nasypem przy pomocy geowłókniny i 0,5m warstwy kruszywa naturalnego: **14 000 m²**
- Nasyp przeciążający: **15 000 m³**
- Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego z dokopu: **135 000 m³**
- Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego wykopu: **9 000 m³**
- Wykonanie wykopów z bezpośrednim przemieszczeniem na nasyp: **9 000 m³**
- Wykonanie zasypek pasa środkowego, poboczy oraz na MOP-ach: **10 000 m³**
- Wykonanie górnej warstwy nasypu/ warstwy mrozoochronnej: **22 000 m³**
- Wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5MPa gr. 20 cm: **35 000 m²**
- Wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm: **13 800 m²**
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm: **30 000 m²**
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm: **12 000 m²**
- Wykonanie warstwy podbudowy z BA WMS gr. 17 cm: **42 000 m²**

- Wykonanie warstwy wiążącej z BA WMS gr. 8 cm: **52 000 m²**
- Wykonanie warstwy wiążącej z BA gr. 4 cm: **11 500 m²**
- Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA gr. 4 cm: **55 000 m²**
- Ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych: **1 000 m**
- Humusowanie skarp: **35 000 m²**
- Umocnienie poboczy kruszywem białym łamanym: **2 000 m²**
- Ustawienie bariery ochronnej stalowej typ SP-01: **1 000 m**
- Ustawienie bariery ochronnej stalowej typ SP-07: **1 000 m**
- Ekran akustyczny – wykonanie pali: **480 m**

SPO i MOP

- Roboty murowe

ROBOTY MOSTOWE

- WD 203 – betonowanie płyty ustroju, sprzężanie ustroju
- WD 204 – betonowanie kap chodnikowych, montaż odwodnienia, zasypki, montaż dylatacji
- WD 205 – zbrojenie kap chodnikowych, montaż odwodnienia, montaż dylatacji
- WD 206 – izolacja płyty ustroju, montaż krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych
- WD 207 – montaż krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych, montaż odwodnienia, zasypki
- WA 208 – betonowanie kap chodnikowych, zasypki, montaż dylatacji
- WA 209 – zbrojenie i betonowanie fundamentów i podpór, deskowanie ustroju (prześło nad koleją), montaż łożysk
- WD 210 – montaż rusztowań i deskowania, zbrojenie ustroju nośnego, montaż łożysk, zasypki
- WD 211 – deskowanie i zbrojenie płyty ustroju (jezdni lewa), montaż łożysk, betonowanie ustroju (jezdni prawa)
- WD211A – montaż krawężnika, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych
- WD212 – zbrojenie płyty ustroju
- WD 213 – montaż rusztowania i deskowania, zbrojenie płyty
- WD 214 – izolacja płyty, montaż krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych
- KP 214A – malowanie konstrukcji stalowej, montaż łożysk, deskowanie schodów

- WD 215 – betonowanie kap chodnikowych, montaż odwodnienia
- MA 217 – montaż rusztowania i deskowania ustroju, zasypki
- WD218 – zbrojenie i betonowanie płyty ustroju
- Ściany oporowe – montaż paneli,
- Nasypy zbrojone – wykopy, montaż siatek stalowych, wykonanie nasypów zbrojonych
- Przepusty - wykonanie powłok ochronnych na elementach żelbetowych,
- montaż przepustów z rur stalowych P32, P33 oraz P37

ROBOTY BRANŻOWE

Elektroenergetyka (kolizje SN i NN) – kontynuacja robót

Teletechnika (kolizje T) – kontynuacja robót

Wodociągi (kolizje W) – kontynuacja robót: wykopy, układanie rur, zasypki, próby szczelności

Telematyka – kontynuacja robót

Kanalizacja deszczowa:

- kolektor KD7A (66m), KD7B (53m), KD7C (40m), KD7D (95m)
- montaż studni wpadowych KD18 (3 szt.), KD3 (2 szt.), KD4 (2 szt.), KD5 (2 szt.), KD7 (3 szt.), KD10 (1 szt.)
- studzienki wpustowe fi 450 – 80 szt.
- przykanaliki – 500 m

Drenaż i zbiorniki:

- kolektor KDR1 (400m), KDR2 (90m), KDR3 (90m), KDR6 (50m), KDR7 (185m), KDR30 (300m), KDRL9 (700m), KDRL4 (250m), KDR9 (100m), KDRL2 (400m), KDRP2 (150m), KDR5 (50m)
- zbiorniki ZB3 (0,5 kpl), ZB4 (0,5 kpl), ZB11 (0,75 kpl), ZB14 (0,5 kpl)

Plan robót budowlano montażowych na miesiąc październik ma obejmować roboty przewidziane do wykonania zgodnie z uaktualnionym harmonogramem oraz roboty zaległe nie wykonane w poprzednich miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień 2011r. stanowi to kwotę 81861000 zł.

W miesiącu sprawozdawczym /wrzesień 2011r/, warunki atmosferyczne – były bardzo dobre i sprzyjały wykonywaniu robót budowlano montażowych.

Wykonawca w dalszym ciągu nie jest w stanie prowadzić roboty zgodnie z uaktualnionym harmonogramem robót. Nie prowadzi robót na dwie pełne zmiany, w robotach mostowych i branżowych.

Analiza zaawansowania w stosunku do uaktualnionego Harmonogramu Robót z dnia 10.03.2011r./ narastająco do końca miesiąca września/

-Roboty Drogowe 35%

-Roboty Mostowe 57%

- Roboty Branżowe 47%

Analiza w stosunku do harmonogramu stanowiącego załączniki do Umowy /narastająco od początku budowy do końca września/

1. W robotach Drogowych- 31,3%

2. Inżynierskich- 54,4%

3. Branżowych- 48,5%

Upływ czasu- 67,48%

Postęp robót budowlano- montażowych w miesiącu wrześniu, pomimo bardzo dobrych warunków atmosferycznych, jest niezadawalający. W robotach drogowych i ogólnobudowlanych/ MOP-y Krzyżanów Wschodni i Zachodni oraz SPO Kotliska/ jest wręcz zły. Zaawansowanie robót w stosunku do planów miesięcznych i Harmonogramu, w granicach-34% i 47% jest wynikiem zdecydowanie mocno niezadawalającym. Należy pamiętać, że Wykonawca cały czas nadrabia olbrzymie zaległości z 2010r. i z tego względu wyniki za wrzesień należy ocenić negatywnie. Zaprzestanie robót drogowych w km 259+200 do km 260+000 oraz ograniczenie robót przy wykopie w km 260 do 261 jedynie do robót zmiennych, bez doprowadzenia podłoża do właściwych parametrów, daje złe perspektywy na kolejny miesiąc. Przedstawiane przez Wykonawcę Roszczenia finansowe/negatywne stanowisko Inżyniera zostało wyrażone w piśmie nr ZBMIZ-SGS/A1/C/SW/07/01/067/07/2011 z dnia 07.07.2011r./ nie mogą być powodem do ograniczenia do minimum, bądź zaprzestaniem prowadzenia robót.

Wykonawstwo obiektów inżynierskich jest zadawalające, chociaż w dalszym ciągu nie jest zgodne z Harmonogramem i planem finansowym. Wykonanie 90% przepustów pod autostradą, oraz zaawansowanie rzeczowe robót budowlano montażowych na wiaduktach i moście autostradowym do 72%

Daje dobre perspektywy na dalsze miesiące.

3.0 ZAANGAŻOWANIE PERSONELU I SPRZĘTU WYKONAWCY

3.1 Personel Wykonawcy

W miesiącu sprawozdawczym na kontrakcie zatrudniony był następujący personel:

Ilość zasobów kadrowych Wykonawcy

-Roboty Drogowe 7

-Roboty Mostowe 7

-Roboty Branżowe 8

Ilość zasobów kadrowych Wykonawcy- Personel fizyczny /średnio w m-cu/

- Roboty Drogowe 205

-Roboty Mostowe 310

-Roboty Branżowe 43

3.2 Sprzęt Wykonawcy

Poniżej przedstawiono zestawienie sprzętu posiadanego przez Wykonawcę.

Rodzaj sprzętu	Ilość
Spycharka	14
Koparka gąsienicowa	17
Koparka kołowa	14
Koparko-ładowarka	20
Ładowarka	11
Walec gładki	19
Walec okołkowany	9
Walec ogumiony	8
Równiarka	5
Rozkładarka	6

Beczkowóz	11
Ciągnik+zamiatarka	5
Ciągnik+przyczepa niskopodłogowa	1
Dźwig	15
Płyta wibracyjna	4
Wozidło	9
Power-curber	1
Skrapiarka	1
Samochody samowładowcze trzyosiowe, czteroosiowe, ciągniki z naczepą	180

W załączeniu nr 20- Wyniki kontroli pracowników i sprzętu Wykonawcy przeprowadzonej przez Inżyniera w miesiącu Wrześniu 2011 roku.

3.3 Podwykonawcy

W załączniku nr 14 przedstawiono wykaz podwykonawców zgłoszonych w okresie sprawozdawczym.

4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Dokumentację fotograficzną robót zamieszczono w załączniku nr 3.

5. BHP

1. Wykonawca i Inżynier prowadzą ciągły nadzór w ramach przepisów BHP. terenu Inżynier zwrócił uwagę Wykonawcy na przestrzeganie obowiązku noszenia kasków i kamizelek na budowie. Inżynier przypomina Wykonawcy o oznakowaniu terenu budowy znakami drogowymi, jak również myciu i czyszczeniu pojazdów opuszczających teren budowy, aby zapobiec roznoszeniu błota poza teren budowy.
2. Inżynier zgłasza zastrzeżenia do braku poręczy na płytach na obiektach WD 204, WD205.
3. Szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników wykonywane są na bieżąco.
4. Na bieżąco wyposażano pracowników w ubrania robocze, obuwie i środki ochrony indywidualnej.
5. W okresie sprawozdawczym wypadków ani innych zdarzeń potencjalnie wypadkowych nie było.
6. Inżynier ma zastrzeżenia do Jakości oznakowania pionowego na objeździe Drogi Krajowej nr 2 w obrębie Węzła Kotliska
- Pismo nr ZBM IŻ- SGS/A1/C/SW/07/01/084/09/2011

7. Nad bezpieczeństwem na budowie ze strony Wykonawcy sprawuje nadzór Pan Jacek Prykiel, natomiast ze strony Inżyniera Pan Jerzy Pogruszewski.

6.0 JAKOŚĆ

6.1. Programy Zapewnienia Jakości

Program zapewnienia jakości: Inżynier stwierdza pogorszenie jakości robót w branży wodno-kanalizacyjnej przy wykonywaniu zbiorników retencyjnych. Inżynier ma zastrzeżenia do jakości wykonywanego odwodnienia odprowadzenia wód- opadowych

-Pismo nr ZBM IŻ- SGS/A1/C/JU/07/01/100/09/2011

Inżynier zgłasza zastrzeżenia do jakości robót izolacyjnych na obiektach WD 204,WD 205.

Inżynier zgłasza zastrzeżenia do jakości robót ziemnych w wykopie- brak wzmocnienia gruntu rodzimego i dna koryta drogowego.

Wykaz materiałów zamieszczono w załączniku nr 4.

7.0 MATERIAŁY I WYTWÓRNIE

7.1. Wytwórnice

Wykonawca posiada zatwierdzoną Wytwórnice Stalowych Konstrukcji Mostowych EXBUD SKANSKA i zatwierdzoną warunkowo Wytwórnice betonu GO-TRAKT. Wykonawca posiada także zatwierdzona wtórnice betonów oraz kończy montaż wytwórnice mas bitumicznych.

7.2. Materiały przeznaczone do wbudowania zgłoszone przez Wykonawcę.

Inżynier na bieżąco sprawdza dostarczane wnioski i jeżeli posiadają błędy to zwracane są do poprawy bądź wymiany załączonych dokumentów.

Inżynier zwracał uwagę Wykonawcy na dokładniejsze sporządzanie wniosków o zatwierdzenie materiałów ponieważ przez brak odpowiednich dokumentów powoduje nie możliwość zatwierdzenia wniosków.

Wykaz materiałów zamieszczono w załączniku nr 5.

7.3. Badania kontrolne wykonane przez LD w Łodzi.

Badania kontrolne są wykonywane przez Wydział Technologii-Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział w Łodzi ul. Wólczańska 17, 90-731 Łódź. W okresie objętym raportem w czasie budowy była prowadzona bieżąca kontrola badań Wykonawcy na budowie. Konsultant prosi o zwiększenie zakresu badań przez OLD- badania nie niszczące betonu.

Wykaz badań kontrolnych zamieszczono w załączniku nr 6

8.0 ZMIANY

W okresie objętym raportem Inżynier nie wydał Polecenia Dokonania Zmiany.

9.0 ROSZCZENIA

Nr	Opis roszczenia	Czas	Finanse	Status
1	Osnowa geodezyjna - Przekazanie Wykonawcy dokumentacji obarczonej błędem uniemożliwiającym prowadzenie robót zgodnie z Projektem Wykonawczym oraz przygotowania osnowy zgodnie z wymaganiami ST	54	1 501 512,72	Ostateczne do sądu
2	Wycinka drzew + inwentaryzacja - Przekazanie Wykonawcy dokumentacji obarczonej błędem wstrzymującym pracę oraz nakładającym na Wykonawcy dodatkowy obowiązek wykonania dodatkowej dokumentacji.	25	251 440,00	Ostateczne
3	Kamień Milowy - Brak możliwości uzyskania minimalnej kwoty wykonania określonej klauzulą 8.13 WK FIDIC spowodowanej czynnikami niezależnymi od Wykonawcy	6%	0	Roszczenie ostateczne
4	Zalana Budowa - w związku z wystąpieniem siły wyższej określonej subklauzulą 17.3(h) WK FIDIC. Opady deszczu w miesiącu wrześniu i listopadzie 2010 r.	118	696 591,82	Przejęciowe w toku
5	Niezgodność geologiczna podłoża - w związku z wystąpieniem nieprzewidywalnych warunków fizycznych określonych subklauzulą 4.12(h) WK FIDIC. (stabilizacja cementem)	w toku	0	Powiadomienie w toku
6	Brak Nadzoru na terenie budowy uniemożliwił bieżące prowadzenie robót oraz rozwiązywanie problemów 20.1, 8.4	76	0	Ostateczne
7	Rozlewisko rzeki Ochnia - wystąpienie siły wyższej	126	0	Przejęciowe
8	Rozlewisko rzeki Ochnia - wystąpienie siły wyższej	w toku	0	Powiadomienie w toku
9	Sieć PLK - Brak uzupełnionego i uzgodnionego projektu przebudowy sieci trakcyjnej PLK	w toku	0	Powiadomienie w toku
10	Linia NN - Brak uzgodnionego projektu przebudowy linii NN w km 256+290	w toku	0	Powiadomienie w toku
11	Nadzór przyrodniczy - Dodatkowe usługi - nadzór przyrodniczy + zabezpieczenia	w toku	0	Powiadomienie w toku
12	Obszar zajętości - Brak wymaganego warunkami realizacyjnymi obszaru zajętości dla prowadzenia robót elektroenergetycznych	w toku	0	Powiadomienie w toku
13	Dodatkowe koszty z tytułu otrzymanych pełnomocnictw do reprezentowania GDDKiA w rozmowach z PKP oraz wstrzymanie robót na obiekcie WD209 do czasu podpisania uzgodnień	54	0	Powiadomienie w toku
14	Brak uzgodnionego projektu przebudowy linii WN	w toku		Powiadomienie w toku
15	Brak zapłaty za materiały dostarczone na teren budowy - uchybienie warunkom kontraktu przez Inżyniera	w toku	0	Powiadomienie w toku
16	Wystąpienie warunków atmosferycznych (Opady deszczu) powodujących w miesiącu lipiec 2011 wstrzymanie robót do czasu obeschnięcia gruntu	w toku	0	Powiadomienie w toku

Zestawienie roszczeń i powiadomień zamieszczono w załączniku 7.

10.0 ZAANGAŻOWANIE FINANSOWE

Wartość brutto Kontraktu 546 417 789,80 PLN

Miesiąc sprawozdawczy – Wrzesień 2011, jest kolejnym miesiącem gdzie Wykonawca nie prowadzi robót zgodnie z harmonogramem. Przyczyny opóźnień w miesiącu sprawozdawczym to kłopoty z Projektem Technicznym – Obiekty Kubaturowe Mopów oraz braki kadrowe /zbrojarze, cieśle/ przy budowie wiaduktów. W robotach drogowych – ograniczony front robót ze względu na nie wykonanie całości robót przy przepustach. Szczegółowe dane zawarte są w załączniku nr 8.

Inżynier Rezydent nie posiada informacji na temat kontroli finansowej Kontraktu.

11.0 KONTRAKT NA ZARZĄDZANIE I NADZÓR

11.1. Postęp finansowy

Cała wartość umowy na „Zarządzanie kontraktem: budowa Autostrady A1 Toruń – Stryków, od km 215+850 do km 291+000, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót” dla Inżyniera wynosi 24 241 479,41 zł (brutto).

Zaangażowanie osobowe zespołu Konsultanta

Od początku realizacji usługi pojawiły się problemy kadrowe wynikające ze zmian w planach osobistych niektórych członków zespołu z uwagi na zajęcie drugiego miejsca w pierwotnym rozstrzygnięciu przetargu. Po okazaniu się jednak że ZBM IZ będzie prowadził nadzór inwestorski na inwestycją spowodowało to konieczność dokonania, za zgodą Zamawiającego zmian w składzie ekspertów.

Zestawienie zaangażowania osobowego zespołu Konsultanta w załączniku nr 10.

12.0 NADZÓR INŻYNIERA

12.1. Nadzór archeologiczny

Wykonawca prowadzi wszystkie prace ziemne pod stałym nadzorem archeologicznym.

W załączniku nr 11 znajduje się raport z nadzoru nad archeologicznymi badaniami wykopaliskowymi prowadzonymi podczas trwania robót budowlanych.

12.2. Nadzór w zakresie wycinki zieleni i drzew

Wykonawca prowadzi wszystkie prace ziemne pod stałym nadzorem.

W załączniku 12 znajduje się cotygodniowe raporty z postępu wycinki i składowania drewna.

12.3. Nadzór w zakresie nadzoru środowiskowego

Inżynier na bieżąco kontroluje postępowanie Wykonawcy w sprawach związanych z ochroną środowiska. Wszelkie problemy są na bieżąco rozwiązywane na budowie.

W załączniku 13 znajduje się comiesięczne sprawozdanie z prowadzonego nadzoru środowiskowego.

13.0 KORESPONDENCJA.

Z okresu sprawozdawczego korespondencja pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą a Inżynierem znajduje się na płycie CD. Inżynier Rezydent oświadcza o kompletności korespondencji kontraktowej dołączonej do Raportu. Decyzji i postanowień administracyjnych w okresie sprawozdawczym nie było.

Korespondencja za miesiąc wrzesień 2011r. – załącznik nr 21

Film dokumentujący postęp robót –załącznik nr 22

Załącznik nr 3 – Dokumentacja fotograficzna



Wykop km 260+800



Wykonanie wzmocnienia podłoża pod nasypem przy pomocy geowłókniny i 0,5 warstwy kruszywa naturalnego(materac).



Wykonanie warstwy nasypu z gruntu dowiezionego z dokopuŁącznica BC przy WD 211
Wykonanie zasyпки nasypów zbrojonych wraz z zagęszczeniem.



Układanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem gr 20 cm o $R_m=5\text{Mpa}$
km 253+150-253+450



Wykonana warstwa kruszywa stabilizowanego cementem gr 20 cm o $R_m=5\text{Mpa}$



Układanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w-waII



Układanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności gr.17 cm



Profilowanie pasa rozdzielającego.



Wykonanie górnej warstwy nasypu-trasa główna.



Wykonywanie ścieku ulicznego z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych.



Ułożona górna warstwa nasypana drodze dojazdowej 258LB



Wykonywanie górnej warstwy nasypu droga dojazdowa 253PL



Układanie kanalizacji deszczowej KD 18



Budowa zbiornika ZB 8.



Budowa zbiornika ZB 13



Budowa zbiornika ZB 2



WD 203



15.09.2011

WD 205



14.09.2011


WD 211A



KP 214A



MA 217

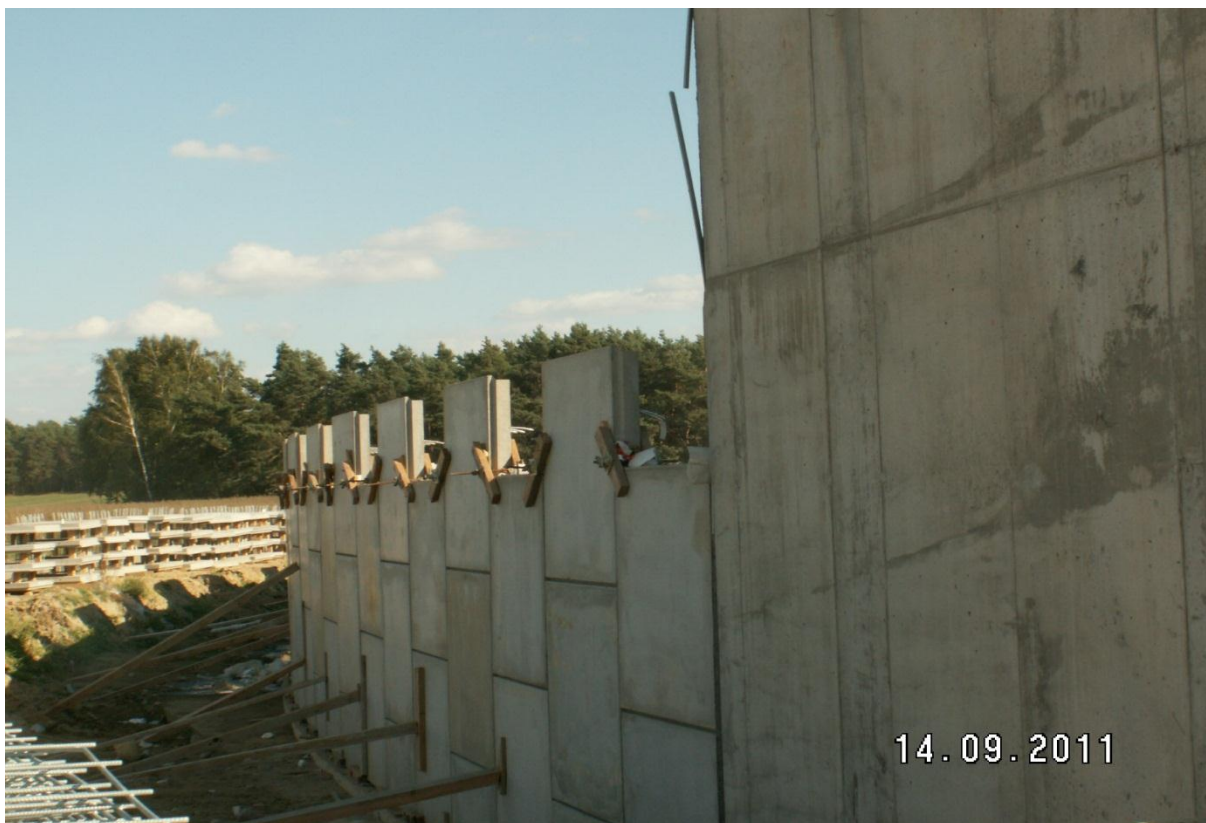

Ściana oporowa WD 213



Ściana oporowa WD 211



SPO Kotliska



Przepust P4



Przepust P9



Przepust P17



Przepust P15



Budowa obiektów małej Architektury MOP Krzyżanów

Załącznik nr 2 – Data rozpoczęcia inwestycji

Załącznik nr 4 –Zestawienie Programów Zapewnienia Jakości

Załącznik nr 5 - Wykaz zgłoszonych materiałów do wbudowania

Załącznik nr 6 - Wykaz badań kontrolnych

Załącznik nr 7 - Zestawienie roszczeń

Załącznik nr 8 - Zestawienie finansowe

Załącznik nr 9 - Graficzne przedstawienie postępu robót

Załącznik nr 10 - Zestawienie osobowe Konsultanta

Załącznik nr 11 - Raport z nadzoru archeologicznego

Załącznik nr 12 - Raport z postępu wycinki i składowania drewna-Roboty związane z wycinką drzew na Odcinku Sójki- Kotliska nie są prowadzone.

Załącznik nr 13 - Raport z Nadzoru Środowiskowego

Załącznik nr 14 Zestawienie Podwykonawców

Załącznik nr 15 - Spotkania z Biurem Projektów

Z chwilą wprowadzenia stałego Nadzoru Autorskiego przez Biura Projektów ARCADIS i Mosty Katowice spotkania z Projektantami są ograniczone do minimum.

Załącznik nr 16 -Gwarancja i ubezpieczenie Kontraktu

Załącznik nr 17 - Protokoły odbioru oznakowania tymczasowego

Załącznik nr 20 – Wyniki kontroli pracowników i sprzętu Wykonawcy przeprowadzonej przez Inżyniera w miesiącu Wrześniu 2011 roku.
